

C.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXHUATLANCILLO  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

**INFORMACION RECEPCIONADA:** INFORMACION DE OBRA PUBLICA

**PERIODO:** MAYO

**FECHA DE RECEPCION:** 25/06/2018

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA:** 25/06/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓			25/06/2018	18:46:52
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓			25/06/2018	18:47:11
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓			25/06/2018	18:47:29
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓			25/06/2018	18:47:45
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓			25/06/2018	18:48:01

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36754

C. Israel Pérez Villegas  
IXHUATLANCILLO  
P R E S E N T E.

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Dani Espinosa Reyes
Observaciones:	

Cadena original:

BNmlpjKXTJG20t21w5OayqPG/PMuAxBbDf3H/Ep8c4/  
ocHErpVXBCNRFdl+7oGwzTvfV0dpcKrWtFWdFEHheZ3p9s6CgFQpkasmBiNXX8Svt4JBraDUmJl1nglvccI9  
PMR3q8gt6Mbpt1qU8IOSrgwkKsfN6n5N/uzCJq5hVgEY=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36764

C. Israel Pérez Villegas  
IXHUATLANCILLO  
P R E S E N T E.

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Dani Espinosa Reyes
Observaciones:	

Cadena original:

mMhJ3n9E5Bh1NPDb7DKA/  
sUNWQkZ4ubS21nKma8UtZ3ACskNh5KKIDY+qBg9Uw1UmGdsZpXeLZs6eG0Z4p8O4sJQThwdGr+V/  
rxIN8PhQ8XMnmM948KI3lIF9b3gSlwadiVDFYeyZG7mCsPq7JBeQxRLvJg7RHIS0fGC26UcicY=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS.  
No. DE OFICIO: REM/OP/2018/026  
ASUNTO: REPORTES MENSUALES DE OBRA PUBLICA.

DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ.  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.  
XALAPA, VER.  
P R E S E N T E.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE  
FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE REMITO A USTED LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA  
PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 DE LOS FONDOS:

- FISM
- FORTAMUN-DF

SIN OTRO PARTICULAR Y POR CUALQUIER DUDA AL RESPECTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
IXHUATLANCILLO, VER. A 25 DE JUNIO DE 2018.



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
2018 - PRESIDENTE MUNICIPAL

C.C.P. DIP. LORENZO ANTONIO PORTILLA VAZQUEZ. - AUDITOR GENERAL, TITULAR ORFIS PARA SU  
CONOCIMIENTO.  
C.P. Archivo.



*Un Gobierno en Tus Manos!*  
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

**IXHUATLANCILLO**

*Un Gobierno en Tus Manos!*



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS

No. DE OFICIO: REM/OP/2018/025

ASUNTO: REPORTES MENSUALES DE OBRA PUBLICA.

C. P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VAZQUEZ.  
AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION  
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE.  
XALAPA, VER.  
P R E S E N T E.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE REMITO A USTED LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018 DE LOS FONDOS:

- FISM
- FORTAMUN-DF

SIN OTRO PARTICULAR Y POR CUALQUIER DUDA AL RESPECTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
IXHUATLANCILLO, VER. A 25 DE JUNIO DE 2018.



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

C. LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.C.P. DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ. - PRESIDENTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA SU CONOCIMIENTO.

C.P. Archivo

*Un Gobierno en Tus Manos!*  
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

**Av. Independencia No. 85 Col. Centro Ixhuatlancillo, Ver C.P. 94430 Tel. (272) 72 13570**

**email: ixhuatlancillo2018-2021@hotmail.com**



*Dani Espinosa*

**ACTA DE SESIÓN DE CABILDO  
EXTRAORDINARIA**



En la Cabecera Municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las Doce horas del día dieciocho de junio del año 2018, reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, planta alta, ubicado en Avenida Independencia Número 85 de esta Cabecera Municipal, los ciudadanos Lic. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS, Presidente Municipal, C. ALFREDA NICOLAS VICENTE, Sindica Municipal, C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA, Regidor Único, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlancillo, Veracruz, asistidos por el C. FERNANDO OCHOA VERGARA, Secretario del H. Ayuntamiento, así como el C. Ing. Dani Espinosa Reyes Director de Obras Públicas, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo prevista por los artículos 36 Fracción primera de la referida Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la oportunidad debida, bajo el siguiente proyecto de:-



**ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.-** Lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum legal.
- SEGUNDO.-** Lectura y Aprobación del Orden del día.
- TERCERO.-** Revisión en su caso aprobación de los Estados de Obra Pública del mes de mayo del 2018, así como su remisión al H. Congreso del Estado de Veracruz y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- CUARTO.-** Clausura de la sesión.



**PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.** El C. FERNANDO OCHOA VERGARA, Secretario del H. Ayuntamiento, pasa lista de asistencia y da cuenta al LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS, Presidente Municipal que se encuentran presentes tres de un total de tres integrantes del cabildo, por lo que hay Quórum legal para sesionar de conformidad al artículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento.



**SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** El C. FERNANDO OCHOA VERGARA, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden día en los términos de la Convocatoria sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por mayoría de votos, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

*Un Gobierno en Tus Manos!*  
"SE TLAFUANI IPA-MOMAWUA"



**TERCERO.-** Solicitando el uso de la voz el Presidente Municipal LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS, quien manifiesta al Cabildo en pleno que el H. Congreso del Estado de Veracruz, solicita la autorización de este H. Cabildo para que sean presentados ante la Legislatura y el Órgano de Fiscalización Superior, los estados de Obra Pública correspondiente al mes de mayo y sobre el particular el Ing. Dani Espinosa Reyes, Director de Obras Públicas, presenta al cabildo el reporte mensual de obra pública del mes de mayo del año 2018, en atribución del artículo 73 y 73 Bis Tercera fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre para su remisión al congreso del Estado en uso de la voz el Ing. Dani Espinosa Reyes Director de Obras Publicas manifiesta que al cierre del mes de mayo se presentan los anexos correspondientes a los reportes mensuales de obras con movimientos al cierre del mismo mes,. Leída que fue la propuesta el Secretario del H. Ayuntamiento, el ciudadano Fernando Ochoa Vergara, pregunta a los ediles, ahí reunidos, se sirvan Manifiestar sus puntos de vista, y después de ser escuchados y analizados se procede a tomar el siguiente:

RESIDENCIA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IGHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

**A C U E R D O.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** los Estados de Obra Pública del mes de mayo del 2018, Y SE PIDE SEA ENVIADO A LA BREVEDAD POSIBLE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, Y ASI CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, **CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS TRES EDILES** QUE INTEGRAN EL H. CABILDO.- LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. ALFREDA NICOLAS VICENTE, SINDICA MUNICIPAL, C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA, REGIDOR ÚNICO.-

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURÍA ÚNICA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IGHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

**ENVÍESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MÁNDESE PUBLICAR EL PRESENTE ACUERDO POR UNA SOLA VEZ EN LA TABLA DE AVISOS DEL PALACIO MUNICIPAL.**

**CUARTO.-** El C. Secretario del H. Ayuntamiento informa al LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS, Presidente Municipal que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día. Y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión Extraordinaria de Cabildo en el lugar y fecha de su inicio siendo las catorce horas, en El Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ratificándola en su contenido y firma. Damos Fe.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IGHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IGHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IGHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

*Un Gobierno en Tus Manos!*  
 "SE TLATUANI IPA MOMAWUA"



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

**IXHUATLANCILLO**

Un Gobierno en Tus Manos!



**VERACRUZ**  
Gobierno del Estado



**C. LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



*Alfreda Nicolas*  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
**SINDICO MUNICIPAL**



*German Francisco*  
**C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA**  
**REGIDOR ÚNICO**



*Fernando Ochoa Vergara*  
**C. FERNANDO OCHOA VERGARA**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



*Dani Espinosa Reyes*  
**ING. DANI ESPINOSA REYES**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



Un Gobierno en Tus Manos!  
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"





Anexo al oficio No. EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36764

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300810124	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300810125	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RANCHO VERA	No	No	No	No
2018300810126	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300810127	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	No	No	No	No
2018300810128	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE PALACIO	No	No	No	No
2018300810129	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ISIDRO	No	No	No	No
2018300810130	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO	Sí	No	Sí	No

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36764

Anexo al oficio No. EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36754

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300810001	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	No	No	No	No
2018300810002	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 30DPB0931A	No	No	No	No
2018300810003	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL CON CLAVE: 30DCC0107D	No	No	No	No
2018300810004	REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA PRIVADA LA ESCONDIDA.	No	No	No	No
2018300810005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MICHIOACAN DE LA LOCALIDAD DE RANCHO PALA.	No	No	No	No
2018300810006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ Y PROLONGACIÓN DE CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PALA	No	No	No	No
2018300810007	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ORQUÍDEAS	No	No	No	No
2018300810008	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CALLE VERACRUZ Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PALA.	No	No	No	No
2018300810009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECILLAS.	No	No	No	No
2018300810010	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOCE DE DICIEMBRE DE LA COLONIA LOS ÁLAMOS	No	No	No	No
2018300810011	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA DOS CAMINOS.	No	No	No	No



*[Handwritten signature]*

**OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

Anexo al oficio No. EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36754

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300810013	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE TRES ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.	No	No	No	No
2018300810014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 30EPR1062.	No	No	No	No
2018300810015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO.	Sí	No	Sí	No
2018300810016	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.	Sí	No	Sí	No
2018300810017	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS GRANJAS ENTRE LA CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.	Sí	No	Sí	No
2018300810018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO Y CARRETERA A MARIANO LOCALIDAD SAN ISIDRO.	Sí	No	Sí	No
2018300810019	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.	Sí	No	Sí	No
2018300810020	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOS PINOS, LIRIOS, PRIMERA PRIVADA, EL MIRADOR Y SEGUNDA PRIVADA	No	No	No	No
2018300810021	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO.	No	No	No	No
2018300810022	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES VEINTE DE ABRIL Y LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	No	No	No	No

EN COMPLETO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO 0196754



  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
 IXHUATLANCILLO, VER.

## Anexo al oficio No. EMO/2018/IXHUATLANCILLO/36754

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300810023	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ENTRE LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO Y CARRETERA A RANCHO PALA.	No	No	No	No
2018300810024	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	No	No	No	No
2018300810025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO.	No	No	No	No
2018300810026	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELOS.	No	No	No	No
2018300810027	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	No	No	No	No
2018300810028	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA RANCHO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	No	No	No	No
2018300810029	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	No	No	No	No
2018300810030	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOLA DOS.	No	No	No	No
2018300810032	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300810033	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LA ESCONDIDA.	No	No	No	No



*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
25/06/2018  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: SAN ISIDRO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES I No. DE OBRA: 2018300810015

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
SE CONSTRUIRÁN 160.00 ML. DE DRENAJE SANITARIO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO:	\$180,752.65	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$183,899.56	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV	NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	EXISTE
	INVITACION A MENOS DE 3 PERSONAS	X
	licitacion publica	

NO. DE CONTRATO:	2018300810015.00	FECHA:	10/04/2018
CONTRATISTA:	ING. JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO		
MONTO CONTRATADO:	\$180,752.00		
	PROGRAMADA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 02/07/2018	REAL	
	TERMINO 31/08/2018		11/04/2018
	DIAS 45		25/05/2018
	APLICA NO APLICA		45
	MONTO: NO APLICA		X
	FECHA DE PAGO: PORCENTAJE:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$15,582.13	INSURGENTES	\$18,075.27
AFIANZADORA:	1141-35655-1	INSURGENTES	1141-35704-6
No. DE FIANZA:	11/04/2018	IMPORTE/PERIODO	FECHA
FECHA:		EXISTE	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	PLAZO	INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$180,752.00		

Ing. DANI ESPINOSA REYES  
DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

ING. MARCELO VILLALBA  
SUPERVISOR

FORMATO 11

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: SAN ISIDRO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES I No. DE OBRA: 2018300810015

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
SE CONSTRUIRÁN 160.00 ML. DE DRENAJE SANITARIO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		IMPORTE OBRA EST.		AMORTIZADO		CARGOS ADICIONALES		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	5 MILLAR	MONTO	
2	\$69,544.33	010	\$69,544.00	360	\$299.76	\$0.00	\$299.76	\$0.00	\$69,244.57	
1	\$73,683.10	03	\$73,365.00	0	\$317.60	\$0.00	\$317.60	\$0.00	\$73,365.50	
TOTALES	\$143,227.43		\$142,609.00		\$617.36	\$0.00	\$617.36	\$0.00	\$142,610.07	

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		AVANCE FÍSICO REAL												
REPORTE	EXISTE	FECHAS	AVANCE											
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$69,544.33	31/05/2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$143,227.00	31/05/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINIQUITO:	50.00	25/05/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO



OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

\*En caso de requerir más folios en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
25/06/2018  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: SAN ISIDRO DATOS GENERALES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: 2018300810016 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.

ANTECEDENTES:  
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO  
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: RURAL X URBANA  
ZONA: SE ENCUENTRA EN UNA ZAF: SI X NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO  
CLAVE AGEB: N/A  
GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO  
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA  
PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X  
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD 0.000000000 LATITUD 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE 162 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE	FACTURAS	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
2	\$74,119.62	009	\$73,800.13	357	\$74,119.62	\$0.00	\$319.49	\$73,800.13
1	\$73,219.10	004	\$72,903.50	345	\$73,219.10	\$0.00	\$315.60	\$72,903.50
TOTALES	\$147,338.72		\$146,703.63		\$147,338.72	\$0.00	\$635.09	\$146,703.63

MONTO AUTORIZADO: \$183,011.40 C/IVA  
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$186,402.73 NO EXISTE NO APLICA C/IVA  
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA  
DEPENDENCIA QUE VALIDA: CAEV  
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE X NO EXISTE NO APLICA  
DEPENDENCIA QUE OTORGA  
LA FACTIBILIDAD: EXISTE  
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE  
LICITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X  
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: 2018300810016.00 FECHA: 10/04/2018  
CONTRATISTA: ING. JOSE ANDRES VACQUEZ MAURO  
MONTO CONTRATADO: \$183,011.00 C/IVA  
PROGRAMADA REAL  
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 11/04/2018 11/04/2018  
TERMINO 26/06/2018 26/05/2018  
DÍAS 46 NO APLICA 46  
APLICA X NO APLICA  
MONTO: X NO APLICA PORCENTAJE:  
FECHA DE PAGO:

ANTICIPO:

TIPO DE FINANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFANZADO:	\$15,776.85	\$18,301.14	\$18,301.14
AFANZADORA:	INSURGENTES	1141-35704-1	INSURGENTES
No. DE FINANZA:	11/04/2018	25/05/2018	1141-35704-1
FECHA:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO	MONTO	PLAZO	INICIAL FINAL
MODIFICATORIO:	NO APLICA	NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$183,011.00		C/IVA

REPORTE

EXISTE	FECHAS
\$73,219.00	31/05/2018
\$147,338.72	31/05/2018
\$0.00	25/05/2018
X	

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO REAL	0	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0
ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

Ing. DANI ESPINOSA REYES DIRECTOR DE OBRAS  
Ing. IVAN SILVESTRE HUERTA SUPERVISOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
25/06/2018  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: SAN ISIDRO DATOS GENERALES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES I No. DE OBRA: 2018300810017 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS GRANJAS ENTRE LA CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.  
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE 164 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

MONTO AUTORIZADO:	\$185,270.80	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$188,783.19	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV	NO APLICA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	2018300810017.00	FECHA:	10/04/2018
CONTRATISTA:	ING. JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO		
MONTO CONTRATADO:	\$185,270.80		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	11/04/2018	28/06/2018	11/04/2018
	TERMINO	28/06/2018	28/05/2018
	DÍAS	48	48
APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X
MONTO:		MONTO:	
FECHA DE PAGO:		FECHA DE PAGO:	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$15,971.62	\$18,527.08	\$18,527.08
AFIANZADOR:	INSURGENTES	INSURGENTES	INSURGENTES
No. DE FIANZA:	1141-35655-0	1141-35704-3	1141-35704-3
FECHA:	11/04/2018	25/05/2018	25/05/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
		INICIAL	FINAL
		NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$185,270.80		
	C/IVA		

Ing. DANI ESPINOSA REYES  
DIRECTOR DE OBRAS  
Ing. IVAN SILVESTRE HUERTA  
SUPERVISOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS GRANJAS ENTRE LA CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.  
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CONSTRUCCION DE 164 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO.  
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		IMPORTE OBRA EST.		AMORTIZADO	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENIGADO
		No.	MONTO	No.	MONTO			
2	\$75,034.67	008	\$74,711.24	359	\$75,034.67	\$0.00	\$323.43	\$74,711.24
1	\$74,263.10	005	\$73,943.00	343	\$74,263.10	\$0.00	\$320.10	\$73,943.00
TOTALES	\$149,297.77		\$148,654.24		\$149,297.77	\$0.00	\$643.53	\$148,654.24

AVANCE FÍSICO REAL	FECHAS											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	40	60	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPORTE	FECHAS	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$74,263.10	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$149,297.77	31/05/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	

OBSERVACIONES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

**H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.**  
**ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**  
**EJERCICIO 2018**

FECHA DE ELABORACIÓN:  
 25/06/2018  
 MES QUE SE REPORTA  
 MAYO

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: SAN ISIDRO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO Y CARRITERA A MARIANO LOCALIDAD SAN ISIDRO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2018300810018

**ANTECEDENTES:**

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO  
 OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO  
 ZONA: URBANA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA  
 SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO PROYECTO CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI X NO  
 COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD 0.000000000 ESPECIAL

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
 CONSTRUCCIÓN DE 158.00 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

MONTO AUTORIZADO:	\$178,492.60	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X NO EXISTE	NO APLICA C/IVA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	2018300810018.00	FECHA:	03/05/2018
CONTRATISTA:	ING. JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO		
MONTO CONTRATADO:	\$178,492.60		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 04/05/2018 REAL 04/05/2018 TÉRMINO 05/06/2018 05/06/2018 DÍAS 33 33		
ANTICIPO:	APLICA MONTO: NO APLICA X FECHA DE PAGO: PORCENTAJE:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$15,387.29	INSURGENTES
AFIANZADORA:	1141-35657-5	04/05/2018
FECHA:	04/05/2018	IMPORTE/PERIODO
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO	INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (+ CONTRATO) DE OBRA:	\$178,492.60	C/IVA

Ing. DANI ESPINOSA REYES  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 Ing. IVAN SILVESTRE HUERTA  
 SUPERVISOR

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		AVANCE FÍSICO REAL																
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO												
1	\$107,095.56	011	\$107,095.56	\$461.62	\$0.00	\$106,633.94	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TOTALES	\$107,095.56		\$107,095.56	\$461.62	\$0.00	\$106,633.94												

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		AVANCE FÍSICO REAL														
No. EST.	MONTO	EXISTE	FECHAS													
	\$107,095.56	\$107,095.56	31/05/2018	AVANCE PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	\$107,095.56	\$107,095.56	31/05/2018	REAL	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
	\$0.00	\$0.00		ACUMULADO	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
				ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPORTE: EXISTE \$107,095.56 FECHAS 31/05/2018

MONTO PAGADO EN EL MES: \$107,095.56

MONTO PAGADO ACUMULADO: \$107,095.56

FINIQUITO: \$0.00

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO



**OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:  
25/06/2018  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: SAN ISIDRO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES | No. DE OBRA: 2018300810019

ANTECEDENTES: SI X NO

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE RURAL X URBANA

ZONA: SI X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: 0.0000000000

LATITUD: 0.0000000000 LONGITUD: 0.0000000000

GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

PROYECTO CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
CONSTRUCCIÓN DE 156.00 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
1	\$105,739.92	012	\$105,739.92	\$0.00	\$455.78	\$0.00	\$105,284.00
TOTALES	\$105,739.92		\$105,739.92	\$0.00	\$455.78	\$0.00	\$105,284.00

ESTADO FINANCIERO DE OBRA\*

IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
\$105,739.92	\$0.00	\$455.78	\$0.00	\$105,284.00

REPORTE

EXISTE	FECHAS
\$105,739.92	31/05/2018
\$105,739.00	31/05/2018
\$0.00	

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE PROGRAMADO REAL	AVANCE REAL	ACUMULADO	ATRASADO (%)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. DE CONTRATO: 2018300810019.00 FECHA: 03/05/2018

CONTRATISTA: ING. JOSE ANDRES VAZQUEZ MALURO

MONTO CONTRATADO: \$176,233.20

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 04/05/2018, TERMINO 05/06/2018, DIAS 33

ANTICIPO: MONTO \$176,233.20, FECHA DE PAGO: NO APLICA, PORCENTAJE: X

TIPO DE FIANZA: ANTIPO

MONTO AFIANZADO: \$15,192.52

AFIANZADORA: INSURGENTES 1141-35658-8

FECHA: 04/05/2018

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO, PLAZO, NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$176,233.20

ING. DAMI ESPINOSA REYES  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. IVAN SIIVESTRE HUERTA  
SUPERVISOR



LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
25/04/2018  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: LOCALIDAD: UNIÓN Y PROGRESO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES I No. DE OBRA: 2018300810130

ANTECEDENTES:  
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO  
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAO MUY BAO X  
ZONA: URBANA AGEB: N/A  
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO NO  
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO NO  
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X  
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X  
LATTITUD: 0.000000000 LONGITUD: 0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:  
SE REHABILITARAN 475.84 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
1	\$147,388.00	0	\$147,388.85	\$0.00	\$635.30	\$0.00	\$146,753.55
	\$200,613.45	0	\$200,613.45	\$0.00	\$864.71	\$0.00	\$199,748.00
TOTALES	\$348,001.45	\$346,520.29	\$348,002.30	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$346,501.55

ESTADO FINANCIERO DE OBRA\*

No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
2	\$147,388.00	147	\$147,388.85	\$0.00	\$635.30	\$0.00	\$146,753.55
	\$200,613.45	145	\$200,613.45	\$0.00	\$864.71	\$0.00	\$199,748.00
TOTALES	\$348,001.45	\$346,520.29	\$348,002.30	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$346,501.55

REPORTES

EXISTE	FECHAS
\$147,388.85	04/04/2018
\$348,002.30	31/05/2018
\$147,388.85	04/04/2018
X	04/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENR	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	45	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	45	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	45	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:  
LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

ING. DANIELSPINOSA REYES DIRECTOR DE OBRAS  
ING. IVÁN SILVESTRE HUERTA SUPERVISOR

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
25/06/2018  
MES QUE SE REPORTA  
MAYO

**DATOS GENERALES**

MUNICIPIO: IXHUATLANCILLO LOCALIDAD: No. DE OBRAS: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOFI 2018

**ANTECEDENTES:**

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

ZONA: URBANA SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA COMPLEMENTARIA

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI NO CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LONGITUD LATITUD

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO	FACTURAS	
										EXISTE	FECHAS
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>											
TOTALES											

**REPORTES**

MONTO PAGADO EN EL MES: EXISTE FECHAS

MONTO PAGADO ACUMULADO: REAL

FINIQUITO: ACUMULADO

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: ATRASO (%)

OBSERVACIONES:

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE PROGRAMADO REAL	AVANCE ACUMULADO REAL	ATRASO (%)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: AFIANZADORA: No. DE FIANZA: FECHA: MONTO IMPORTE/PERIODO FECHA

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO INICIAL FINAL

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: NO APLICA

Ing. DAMI ESPINOSA REYES DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

ING. IVAN SILVESTRE HUERTA SUPERVISOR

FORMATO 11



\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** IXHUATLANCILLO      **Localidad:** SAN ISIDRO      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018  
**No. de obra:** 2018300810015.00      **Periodo:** MAYO      **Número de estimación:** 3 Y FINIQUITO  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE      **Fuente de financiamiento:** FISCAL MUNICIPAL Y DE LAS  
 ENTRE CAMINO VIEJO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO.      **Fecha de revisión:** 25/06/2018



FOTO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

**Observaciones:**

OBRA TERMINADA

ING. IVAN SILVESTRE HUERTA  
 ING. MECANICO ELECTRICISTA  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: IXHUATLANCILLO Localidad: SAN ISIDRO Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018  
 No. de obra: 2018300810016.00 Período: MAYO Número de estimación: 3 Y FINIQUITO  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Fuente de financiamiento: LOCAL MUNICIPAL Y DE LAS  
 ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO. Fecha de revisión: 25/06/2018



FOTO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Observaciones:  
 OBRA TERMINADA Y OPERANDO

IVAN SILVESTRE HUERTA  
 ING. MECANICO ELECTRICISTA  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** IXHUATLANCILLO      **Localidad:** SAN ISIDRO      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018  
**No. de obra:** 2018300810017.00      **Periodo:** MAYO      **Número de estimación:** 3 Y FINIQUITO  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS GRANJAS      **Fuente de financiamiento:** FISCAL MUNICIPAL Y DE LAS  
 ENTRE LA CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO      **Fecha de revisión:** 25/06/2018



FOTO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:

**Observaciones:**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

  
 IVAN SILVESTRE HUERTA  
 ING. MECANICO ELECTRICISTA  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orffis



# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** IXHUATLANCILLO      **Localidad:** SAN ISIDRO      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018  
**No. de obra:** 2018300810018.00      **Periodo:** MAYO      **Número de estimación:** 2 Y FINIQUITO  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO Y CARRETERA A MARIANO LOCALIDAD SAN ISIDRO.      **Fuente de financiamiento:** CIAL MUNICIPAL Y DE LAS      **Fecha de revisión:** 25/06/2018



**FOTO**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

**Observaciones:**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

IVAN SILVESTRE HUERTA  
 ING. MECÁNICO ELECTRICISTA  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orffis



# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** IXHUATLANCILLO **Localidad:** SAN ISIDRO **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018  
**No. de obra:** 2018300810019.00 **Periodo:** MAYO **Número de estimación:** 2 Y FINIQUITO  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA **Fuente de financiamiento:** OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO. **Fecha de revisión:** 25/06/2018



**FOTO**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

**Observaciones:**

OBRA TERMINADA Y OPERANDO

**IVAN SILVESTRE HUERTA**  
**ING. MECANICO ELECTRICISTA**  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orffis





# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	IXHUATLANCILLO	<b>Localidad:</b>	UNIÓN Y PROGRESO	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2018
<b>No. de obra:</b>	2018300810130.00	<b>Periodo:</b>	MAYO	<b>Número de estimación:</b>	2 Y FINIQUITO
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO			<b>Fuente de financiamiento:</b>	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
				<b>Fecha de revisión:</b>	25/06/2018



FOTO

OBRA TERMINADA

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

OBRA TERMINADA

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

IVAN SILVESTRE HUERTA  
ING. MECANICO ELECTRICISTA  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis




H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FORMATO 09

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)


DATOS GENERALES

Municipio: IXHUATLANCILLO Localidad: EJERCICIO FISCAL: EJERCICIO 2018  
 No. de obra: MAYO Número de estimación: FOFI 2018  
 Descripción: Fecha de revisión: 25/06/2018

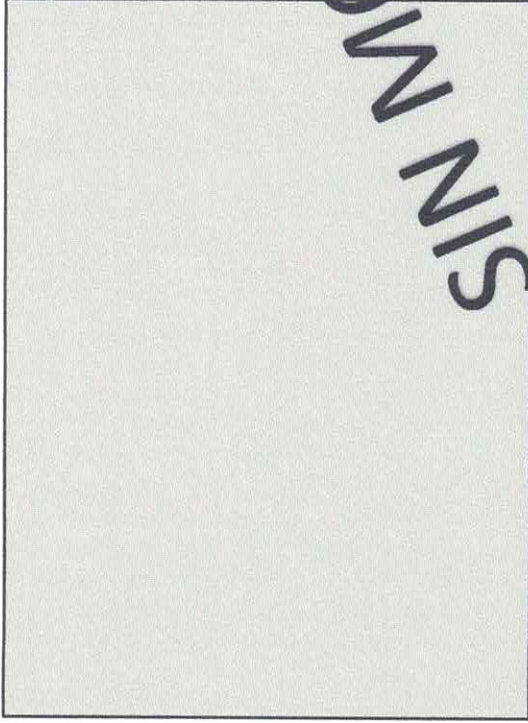

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

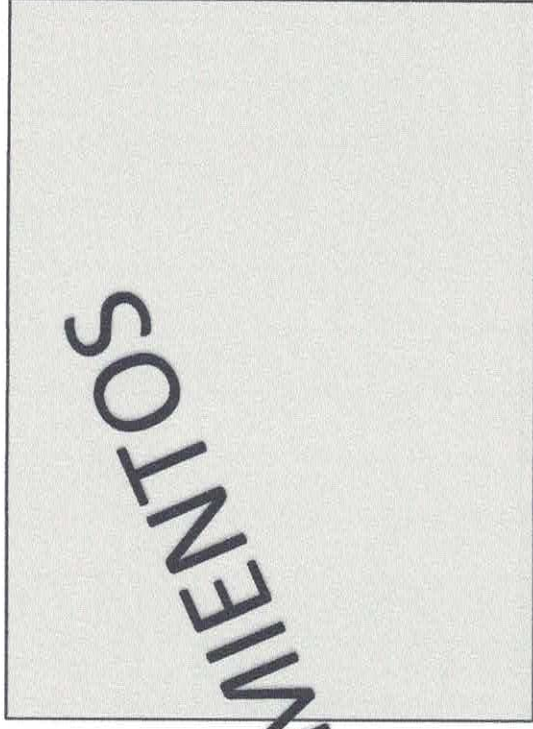

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

ING. MECANICO ELECTRICISTA  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis
